

都市再生整備計画 事後評価シート(原案)
中心市街地地区

平成29年12月

北海道函館市


様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	北海道		市町村名	函館市		地区名	中心市街地地区			面積	200ha				
交付期間	平成25年度～29年度		事後評価実施時期	平成29年度		交付対象事業費	3,245百万円	国費率	0.45						
1) 事業の実施状況	当初計画に位置づけ、実施した事業		事業名												
			基幹事業	市道改良事業(1路線)、地域生活基盤施設(歩行者用案内サイン)、高質空間形成施設(歩道整備事業1路線)、高次都市施設(子育て世代活動支援プラザ、はこだておもしろ館、市民交流プラザ)											
	当初計画から削除した事業		事業名												
			基幹事業	グリーンプラザ整備事業		施設整備計画の策定に時間を要し、計画期間内の整備が困難となった。			削除/追加による目標、指標、数値目標への影響						
	新たに追加した事業		基幹事業	市道放射2-2号線歩道整備事業		五稜郭公園周辺の歩行空間のネットワークの向上のため整備することとしてきたが、バス停留所上屋の整備や歩行動線の観点から歩道整備について見直すこととした。			影響なし						
			提案事業	市道広小路整備事業		グリーンプラザ整備事業と一体的に整備する必要があることから、事業の見直しを行った。			影響なし						
	交付期間の変更		当初	平成25年度～平成29年度		交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響			-						
			変更	なし											
	2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況		指標	単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数値		目標達成度	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期	
			指標1	歩行者通行量	人	40,416	H24	41,000	H29	モニタリング	評価値	○	あり	市街地再開発事業や優良建築物等整備事業により、良好な市街地環境が整い、また、子育て世代活動支援プラザなどの整備や案内機能の向上などにより、中心市街地の往来が増えた。	
指標2			イベント開催数	回/年	45	H23	51	H29	49	57	○	あり	従前からの商店街等によるイベント開催に加えて、新たに整備された公共施設において新規イベントが開催されるなど、新たな賑わいの創出につながった。	H30年4月頃	
指標3			本町・五稜郭地区への来街頻度	%	21	H21	26	H29	18.7	19.8	△	あり	●	目標値にはいたらなかったが、市民交流プラザには、オープンから6か月間で約18万人の来館があり、一定の効果があった。	
指標4			函館駅前・大門地区への来街頻度	%	10.8	H20	20	H29	12	12.4	△	あり	●	目標値にはいたらなかったが、子育て世代活動支援プラザおよびはこだておもしろ館には、オープンから1年間で約17万人の来館があり、一定の効果があった。	
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況		指標	単位	従前値	基準年度	目標値	目標年度	数値		目標達成度※1	1年以内の達成見込み	効果発現要因(総合所見)	フォローアップ予定時期		
		その他の数値指標1	中心市街地内の路面電車の乗降人員数	人	9,929	H23	/	/	11,521	10,903	/	/	利用しやすい環境を整えることにより、観光客をはじめとした路面電車の利用増加につながるとともに、各種事業の整備により中心市街地への往来が増え、利用者の増加につながった。		
4) 定性的な効果発現状況		○市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)の整備によって、周辺の高等学校の生徒が平日の放課後や土日に訪れるようになり、異なる学校の生徒同士や大学生との交流機会が増え、また、民間企業による若者向けのイベントなどの開催もあり、多くの若者の交流の場となっている。 ○優良建築物等整備事業および市民交流プラザ整備によって、近隣の百貨店では、書籍文具の新規取り扱いなどのリニューアルも行われ、来店者数が増加するなど、地区内を回遊する人の流れが生まれてきている。													
5) 実施過程の評価		実施内容				実施状況				今後の対応方針等					
		モニタリング	事業の実施状況の精査や市民アンケート調査等のモニタリング調査を実施し、事業効果を確認した。			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● モニタリングと同様に調査を実施し、調査結果を確認する。					
		住民参加プロセス	なし			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				-					
		持続的なまちづくり体制の構築	まちづくり会社等からの情報提供により、継続的な活動状況を確認した。			都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった				● 今後も中心市街地活性化協議会、まちづくり会社および商店街等と連携し魅力と賑わいあるまちづくりに向け取り組んで行く。					

様式2-2 地区の概要

中心市街地地区(北海道函館市) まちづくり交付金の成果概要

まちづくりの目標	目標を定量化する指標	従前値	目標値	評価値
大目標 市民生活と歴史・文化、観光が融合した回遊性の高いまちづくり 目標1 賑わいある集客拠点の創出 目標2 新たな交流を生む都市空間の創出	歩行者通行量	単位:人 40,416 H24	41,000 H29	45,551 H29
	イベント開催数	単位:回/年 45 H23	51 H29	57 H29
	本町・五稜郭地区への来街頻度	単位:% 21 H21	26 H29	19.8 H29
	函館駅前・大門地区への来街頻度	単位:% 10.8 H20	20 H29	12.4 H29
		単位: H	H	H

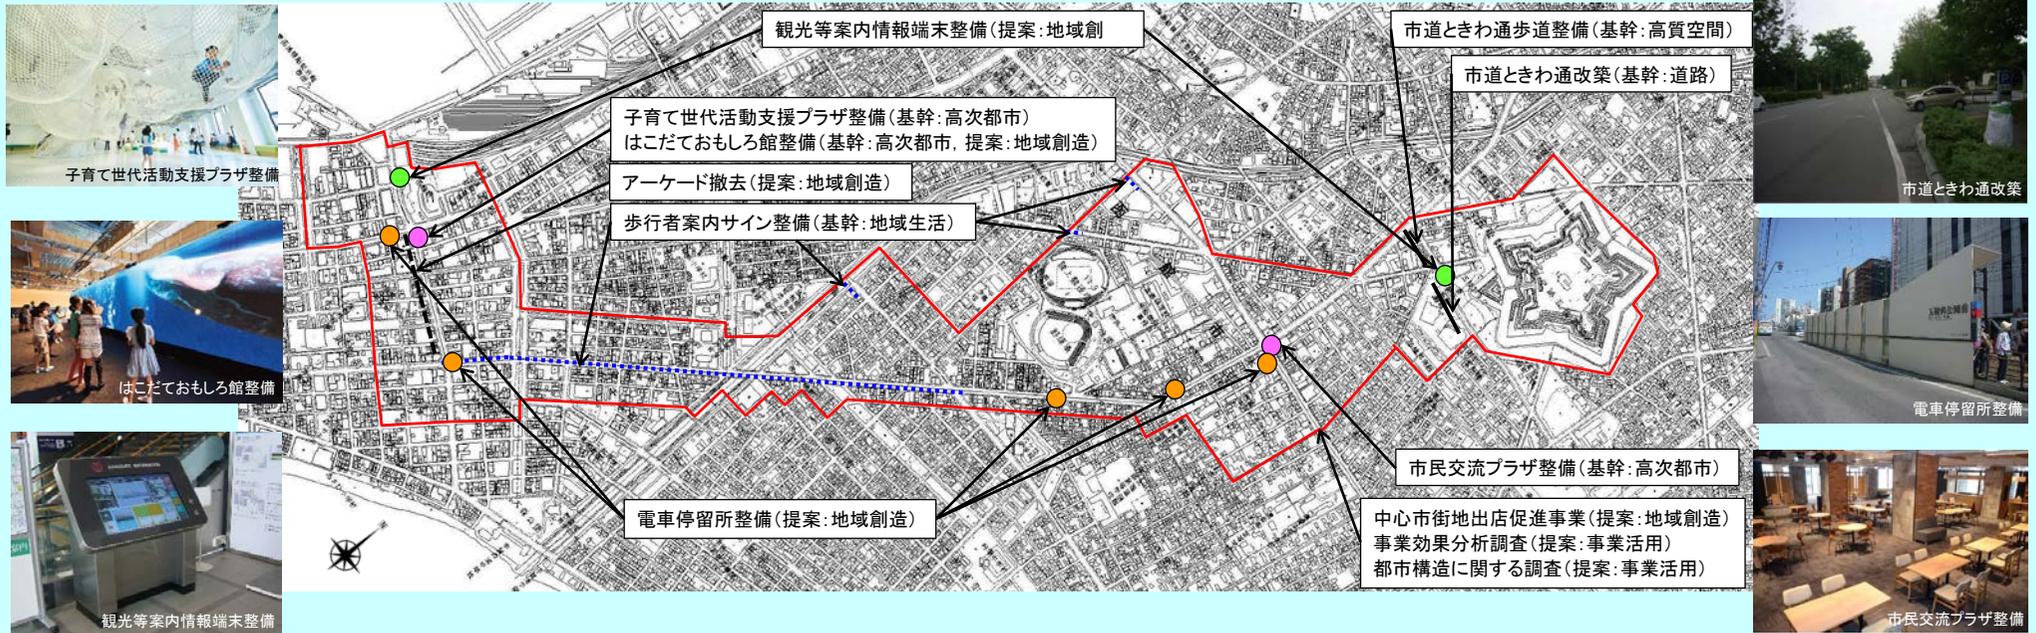

まちの課題の変化

- ・市街地再開発事業および優良建築物等整備事業により、新たな商業施設や公共施設などの集客施設が完成し、そうした施設の利用者が増加した。
- ・中心市街地出店促進事業により主要な道路沿道の空き店舗等に出店を促進させ、沿道の空き店舗の解消が図られた。
- ・子育て世代活動支援プラザ、はこだておもしろ館には、親子での利用はもちろん、孫と祖父母といった方々が訪れており、また、市民交流プラザでは、若者からお年寄りまで多世代による利用が図られ、中心市街地への来街者の増加がみられた。
- ・市道ときわ通の整備やアーケード撤去事業により、安全な歩行空間の整備、電車停留所、歩行者案内サインおよび観光等案内情報端末の整備による回遊しやすい環境が確保された。
- ・関連事業による再開発ビルや新たな商業施設、公共施設などの整備により、観光客が訪れやすい環境が整い、歩行者通行量や中心市街地の観光入込客数が増加した。

今後のまちづくりの方策(改善策を含む)

- ・基盤整備は、ほぼ達成されたので、今後は、ソフト事業の展開による新たな魅力の創出を図って行く。
- ・賑わいを拡大させていくための事業として、商店街、まちづくり会社等が主体となって実施するよう必要な支援を行う。
- ・消費者が必要としている商業機能とするため、商店街やまちづくり会社、整備した公共施設などと情報を共有するとともに、魅力ある商店街の形成のため、各個店それぞれが魅力を高める必要があることから、各個店による様々な取り組みに対し必要な支援を行う。
- ・人口減少、高齢化社会に向け立地適正化計画に基づく都市機能の集約化と居住誘導による中心市街地の形成を進める。
- ・安全・安心な歩行空間の確保のため、国が実施する函館駅前通整備の早期完了を要望する。
- ・整備した公共施設や商店街などの情報発信に取り組む。
- ・自動車利用者向けの駐車場情報の提供、民間駐車場や商店街等との提携駐車場のサービス拡大、店舗情報などを記載した商店街マップの作成などを進める。

都市再生整備計画 事後評価シート (添付書類)

(1) 成果の評価

- 添付様式1-① 都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無
- 添付様式1-② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(完成状況)
- 添付様式2-① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況
- 添付様式2-② その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)により計測される効果発現の計測
- 添付様式2-参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況

(2) 実施過程の評価

- 添付様式3-① モニタリングの実施状況
- 添付様式3-② 住民参加プロセスの実施状況
- 添付様式3-③ 持続的なまちづくり体制の構築状況

(3) 効果発現要因の整理

- 添付様式4-① 効果発現要因の整理にかかる検討体制
- 添付様式4-② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理
- 添付様式4-③ 数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

(4) 今後のまちづくり方策の作成

- 添付様式5-① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制
- 添付様式5-② まちの課題の変化
- 添付様式5-③ 今後のまちづくり方策
- 添付様式5-参考記述 今後のまちづくり方策に関するその他の意見
- 添付様式5-④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画
- 添付様式6 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方
- 添付様式6-参考記述 今後、都市再生整備計画事業の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称(当該地区の次期計画も含む)

(5) 事後評価原案の公表

- 添付様式7 事後評価原案の公表

(6) 評価委員会の審議

- 添付様式8 評価委員会の審議

(7) 有識者からの意見聴取

- 添付様式9 有識者からの意見聴取

(1) 成果の評価

添付様式1-① 都市再生整備計画に記載した目標の変更の有無

	変更		変更前	変更後	変更理由
	あり	なし			
A. まちづくりの目標		●	-	-	-
B. 目標を定量化する指標		●	-	-	-
C. 目標値		●	-	-	-
D. その他()		●	-	-	-

添付様式1-② 都市再生整備計画に記載した事業の実施状況(事業の追加・削除を含む)

基幹事業									
事業	事業箇所名	当初計画		最終変更計画		当初計画からの 変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	都市再生整備計画に記載した まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響	事後評価時の完成状況	
		事業費	事業内容	事業費	事業内容			完成	完成見込み
道路	市道ときわ通改築事業	33	L=190m	22	L=190m	実施設計により内容を精査したため事業費減	影響なし	●	
地域生活基盤 施設	グリーンプラザ整備事業	290	A=4,793.7㎡	0	A=0㎡	施設整備計画の策定に時間を要し、計画期間内の整備が困難となったため、事業を削除	影響なし	—	—
	歩行者用案内サイン整備事業	16	20箇所	15	20箇所	実施設計により内容を精査したため事業費減 完了実績:20箇所→19箇所(中島町の市道内環状1号白滝橋付近の市道両端に2箇所設置予定であったが、幅員が狭く近接しているため1箇所減とした)	影響なし	●	
高質空間形成 施設	市道放射2-2号線歩道整備事業	60	L=240m	0	L=0m	バス停留所上屋の整備や歩行動線の観点から歩道整備について見直すこととしたため、事業を削除	影響なし	—	—
	市道ときわ通歩道整備事業	30	L=150m	38	L=150m	実施設計により内容を精査したため事業費増	影響なし	●	
	市道広小路整備事業	110	L=330.6m	0	L=0m	施設整備計画の策定に時間を要し、計画期間内の整備が困難となったため、事業を削除	影響なし	—	—
高次都市施設	子育て世代活動支援プラザ整備事業	636	A=1,219㎡	782	A=1,218.26㎡	実施設計により内容を精査したため事業費増	影響なし	●	
	はこだておもしろ館整備事業	564	A=1,080㎡	813	A=1,265.93㎡	実施設計により内容を精査したため事業費増	影響なし	●	
	市民交流プラザ整備事業	400	A=1,341㎡	1,017	A=1,181.9㎡	実施設計により内容を精査したため事業費増	影響なし	●	

※1:事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

提案事業									
事業	細項目	当初計画		最終変更計画		当初計画からの 変更の概要 ※1 (事業の削除・追加を含む)	都市再生整備計画に記載した まちづくり目標、目標を定量化する指標、数値目標等への影響	事後評価時の完成状況	
		事業費	事業内容	事業費	事業内容			完成	完成見込み
地域創造 支援事業	アーケード撤去事業	155	L=457.98m	73	L=457.98m	事業内容の精査により事業費減	影響なし	●	
	観光等案内情報端末整備事業	78	8箇所	60	2箇所	スマートフォン用観光等案内情報アプリの運用を開始したことから事業量を見直し設置箇所を主要拠点2箇所のみとしたことによる減	影響なし	●	
	電車停留所整備事業	290	9箇所	316	5箇所	道路管理者、警察等との協議に時間を要することから計画期間内に整備する事業量を見直ししたことによる整備箇所の減	影響なし	●	
	バス停留所上屋整備事業	60	15箇所	0	0箇所	公共交通網の再編に時間を要し、計画期間内の整備が困難となったことから事業の見直しによる削除	影響なし	—	—
	中心市街地出店促進事業	68		68		なし	—	●	
	はこだておもしろ館整備事業	—	なし	51	A=78.75㎡	事業の一部が地域創造支援事業に該当することから追加	影響なし	●	
事業活用調査	事業効果分析調査	8		6		事業内容の精査により事業費減	影響なし	●	
	都市構造に関する基礎調査	—	なし	25		今後のまちづくりについて検討する必要があることから基礎調査を追加	影響なし	●	

※1: 事業費の大幅変更、新規追加がある場合は理由を明記のこと

(参考)関連事業									
事業	細項目	事業箇所名	事業費		事業期間		進捗状況及び所見	備考	
			当初計画	最終変更計画	当初計画	最終変更計画			
函館駅前若松地区第一種市街地再開発事業		函館駅前若松地区	4,372	4,372	平成25年度～28年度	平成25年度～28年度	平成29年3月に竣工し、同ビル内の3・4階の公共施設(高次都市施設)と一体的に活用され、賑わいの拠点となっている。		
函館本町地区優良建築物等整備事業		函館本町地区	3,986	3,986	平成26年度～29年度	平成26年度～29年度	平成29年3月に竣工し、同ビル内の4階の公共施設(高次都市施設)と一体的に活用され、賑わいの拠点となっている。		
函館市元気いっぱい商店街等支援交付金事業			未定	未定	平成23年度～未定	平成23年度～未定			

添付様式2-① 都市再生整備計画に記載した数値目標の達成状況

指標	単位	データの計測手法と評価値の求め方 (時期、場所、実施主体、対象、具体手法等)	(参考)※1 計画以前の値 (ア)		従前値 (イ)		目標値 (ウ)		数値(エ)			目標達成度※2		1年以内の達成見込みの有無		
				基準年度		基準年度		目標年度					あり	なし		
指標1	歩行者通行量	人	函館駅前・大門地区および本町・五稜郭・梁川地区を対象とし、それぞれ8調査地点、合計16地点における平日と休日の2日間の平均値	75,120	H12	40,416	H24	41,000	H29	モニタリング	H27	39,512	モニタリング	△		
										事後評価	確定見込み	●	45,551	事後評価	○	
指標2	イベント開催数	回	中心市街地地区における不特定多数の人が集まる催事で、複数年継続して行われているイベント開催数	-	-	45	H23	51	H29	モニタリング	H27	49	モニタリング	△		
										事後評価	確定見込み	●	57	事後評価	○	
指標3	本町・五稜郭地区への来街頻度	%	アンケート調査による来街頻度(ほぼ毎日から週1回~4回の割合)	-	-	21	H21	26	H29	モニタリング	H27	18.7	モニタリング	×		●
										事後評価	確定見込み	●	19.8	事後評価	△	
指標4	函館駅前・大門地区への来街頻度	%	アンケート調査による来街頻度(毎日から週1回の割合)	-	-	10.8	H20	20	H29	モニタリング	H27	12	モニタリング	△		●
										事後評価	確定見込み	●	12.4	事後評価	△	

指標	目標達成度○△×の理由 (達成見込み「あり」とした場合、その理由も含む)	その他特記事項 (指標計測上の問題点、課題等)
指標1	○:子育て世代活動支援プラザ(はこだてキッズプラザ)、はこだておもしろ館(はこだてみらい館)、市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)整備事業による公共施設整備や関連事業の実施により、官民の施設のオープンによる相乗効果生まれ、歩行者通行量が増加し、目標が達成された。	-
指標2	○:民間主体のイベントが、形を変えて継続または新たに実施されている。また、新規オープンした施設が実施するイベントも追加され、目標を上回る開催数となった。	-
指標3	△:従前値21ポイントから評価値19.8ポイントと減少し、目標値26ポイントに達していないが、モニタリング時の18.7ポイントからは改善が見られる。また、1年以内という短期間では、優良建築物等整備事業や公共施設の整備が民間事業に波及し、新たな集客施設の立地などを誘発するまでにいたっておらず、高頻度の来街者が訪れるといった数値目標の達成は困難であると判断した。	・市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)には、オープンから6か月間で約18万人の来館があり、その中で主な利用者となっているのは10代であるが、従前値に設定している来街頻度は、20代以上の市民を対象としてアンケート調査をしていたことから、10代の来街頻度については、事後評価に反映できなかった。
指標4	△:従前値10.8ポイントから評価値12.4ポイントに回復し、目標値20ポイントに達していないものの、改善が見られる。また、1年以内という短期間では、市街地再開発事業や公共施設の整備が民間事業に波及し、新たな集客施設の立地などを誘発するまでにいたっておらず、高頻度の来街者が訪れるといった数値目標の達成は困難であると判断した。	-

※1 計画以前の値とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。

※2 目標達成度の記入方法

○:評価値が目標値を上回った場合

△:評価値が目標値には達していないものの、近年の傾向よりは改善していると認められる場合

×:評価値が目標値に達しておらず、かつ近年の傾向よりも改善がみられない場合

添付様式2-② その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現の計測

指標	データの計測手法と評価値の求め方 (時期、場所、実施主体、対象、具体手法等)	単位	(参考)※1 計画以前の値 (ア)		従前値 (イ)		数値(ウ)			本指標を取り上げる理由	その他特記事項 (指標計測上の問題点、課題等)
			基準年度	基準年度	基準年度	基準年度					
その他の数値指標1	中心市街地内の路面電車の乗降人員数	人	-	-	9,929	H23	モニタリング	H27	11,521	市民や観光客の身近な移動手段である路面電車の乗降人員数を指標とし、中心市街地内の回遊性向上の目標指標を補完するため設定した。	指標1~4を補完して、地区内の回遊性、利便性の向上を説明する。
							事後評価	確定見込み	●		
その他の数値指標2	-						モニタリング				
							事後評価	確定見込み			
その他の数値指標3	-						モニタリング				
							事後評価	確定見込み			

※1 計画以前の値とは、都市再生整備計画の作成より以前(概ね10年程度前)の値のことをいう。

添付様式2-参考記述 定量的に表現できない定性的な効果発現状況

○市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)の整備によって、周辺の高等学校の生徒が平日の放課後や土日に訪れるようになり、異なる学校の生徒同士や大学生との交流機会が増え、また、民間企業による若者向けのイベントなどの開催もあり、多くの若者の交流の場となっている。

○優良建築物等整備事業および市民交流プラザ整備によって、近隣の百貨店では、書籍文具の新規取り扱いなどのリニューアルも行われ、来店者数が増加するなど、地区内を回遊する人の流れが生まれてきている。

(2) 実施過程の評価

・本様式は、都市再生整備計画への記載の有無に関わらず、実施した事実がある場合には必ず記載すること。

添付様式3-① モニタリングの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容 又は、実際に実施した内容	実施状況	実施頻度・実施時期・実施結果	今後の対応方針等
歩行者通行量調査	予定どおり実施した	● 【実施頻度】毎年度1回(平成24年度以降) 【実施時期】毎年度6月 【実施結果】指標1の歩行者通行量について、計画期間中の変化を確認することができた。	モニタリングと同様に調査を実施し、調査結果を確認する。
	予定はなかったが実施した		
	予定したが実施できなかった (理由)		
市民アンケート調査	予定どおり実施した	● 【実施時期】平成27年, 平成29年 【実施結果】指標3(本町・五稜郭地区への来街頻度), 指標4(函館駅前・大門地区への来街頻度)について、計画期間中の変化を確認することができた。	必要に応じてアンケート調査により確認する。
	予定はなかったが実施した		
	予定したが実施できなかった (理由)		

添付様式3-② 住民参加プロセスの実施状況

都市再生整備計画に記載した内容 又は、実際に実施した内容	実施状況	実施頻度・実施時期・実施結果	今後の対応方針等
—	予定どおり実施した	—	—
	予定はなかったが実施した		
	予定したが実施できなかった (理由)		
—	予定どおり実施した	—	—
	予定はなかったが実施した		
	予定したが実施できなかった (理由)		

添付様式3-③ 持続的なまちづくり体制の構築状況

都市再生整備計画に記載した内容 又は、実際に実施した内容	構築状況	実施頻度・実施時期・実施結果		今後の対応方針等
		i. 体制構築に向けた取組内容	ii. まちづくり組織名:組織の概要	
まちづくり会社や商店街等の賑わい創出活動	予定どおり実施した	● 中心市街地活性化協議会の構成員に属し、賑わい創出に向けたイベント支援など商店街などと連携し、中心市街地の活性化に取り組んでいる。	【組織名】株はこだてティーエムオー 【組織概要】タウンマネジメントに関する企画、調査・研究、設計および管理業務などの業務。	今後もまちづくり会社や商店街等と連携し魅力と賑わいあるまちづくりに向けて取り組んで行く。
	予定はなかったが実施した			
	予定したが実施できなかった (理由)			
函館市中心市街地活性化協議会	予定どおり実施した	● 中心市街地活性化基本計画事業の推進にあたって協議を行うほか、計画の周知、推進のための事業を実施するなど、中心市街地の活性化に取り組んでいる。	【組織名】函館市中心市街地活性化協議会 【組織概要】中心市街地活性化基本計画の実施に関する事項の協議、活性化の推進と発展に寄与してきた。	今後も中心市街地活性化協議会と連携し、中心市街地の活性化に資する事業を推進していく。
	予定はなかったが実施した			
	予定したが実施できなかった (理由)			

(3) 効果発現要因の整理

添付様式4-① 効果発現要因の整理にかかる検討体制

名称等	検討メンバー	実施時期	担当部署
都市再生整備計画事業に係る庁内会議	関係各課(企画部計画推進室計画調整課, 公共交通担当, 経済部商業振興課, 中心市街地担当, 土木部道路建設課, 都市建設部都市計画課, 建築行政課, 企業局交通部施設課)	第1回 平成29年12月15日	経済部中心市街地担当

添付様式4-② 数値目標を達成した指標にかかる効果発現要因の整理

指標の種別		指標1	指標2	その他の数値指標1		-	
指標名		歩行者通行量	イベント開催数	路面電車の乗降人員数			
種別	事業名・箇所名	指標改善への貢献度	総合所見	指標改善への貢献度	総合所見	指標改善への貢献度	総合所見
基幹事業	道路(市道ときわ通改築事業)	—	市街地再開発事業や優良建築物等整備事業により, 良好な市街地環境が整い, また, 子育て世代活動支援プラザ(はこだておもしろ館(はこだておもしろ館), 市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)の整備や案内機能の向上などにより, 中心市街地の往来が増えた。	—	函館市元気いっぱい商店街等支援交付金を活用した従前からの商店街等によるイベント開催に加えて, 新たに整備された子育て世代活動支援プラザ(はこだておもしろ館(はこだておもしろ館), 市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)において新規イベントが開催されるなど, 新たな賑わいの創出につながった。	—	観光等案内情報端末や電車停留所の整備など, 利用しやすい環境を整えることにより, 観光客をはじめとした路面電車の利用増加につながるとともに, 各種事業の整備により中心市街地への往来が増え, 利用者の増加につながった。
	地域生活基盤施設(歩行者案内サイン整備事業)	—		—			
	高質空間形成施設(市道ときわ通歩道整備事業)	—		—			
	高次都市施設(子育て世代活動支援プラザ整備事業)	◎		○			
	高次都市施設(はこだておもしろ館整備事業)	◎		◎			
高次都市施設(市民交流プラザ整備事業)	◎	○					
提案事業	地域創造支援事業(アーケード撤去事業)	○		—		—	
	地域創造支援事業(観光等案内情報端末整備事業)	○	—	—	○	—	
	地域創造支援事業(電車停留所整備事業)	○	—	—	○	—	
	地域創造支援事業(中心市街地出店促進事業)	○	○	—	○	—	
	地域創造支援事業(はこだておもしろ館整備事業)	◎	◎	—	◎	—	
	事業活用調査(事業効果分析調査)	—	—	—	—	—	
	事業活用調査(都市構造に関する基礎調査)	—	—	—	—	—	
関連事業	函館駅前若松地区第一種市街地再開発事業	◎	○	◎	◎	◎	
	函館本町地区優良建築物等整備事業	◎	○	◎	◎	◎	
	函館市元気いっぱい商店街等支援交付金事業	◎	◎	◎	◎	◎	

※指標改善への貢献度

- ◎ : 事業が効果を発揮し, 指標の改善に直接的に貢献した。
- : 事業が効果を発揮し, 指標の改善に間接的に貢献した。
- △ : 事業が効果を発揮することを期待したが, 指標の改善に貢献しなかった。
- : 事業と指標の間には, もともと関係がないことが明確なので, 評価できない。

今後の活用	指標1	指標2	その他の数値指標1
今後各公共施設の利用促進を図るとともに, 地域の商店街等と連携し, 良好な景観の形成や回遊性の向上を図る取り組みを進める。	歩行者通行量	イベント開催数	路面電車の乗降人員数
	歩行者通行量	イベント開催数	路面電車の乗降人員数

添付様式4-③ 数値目標を達成できなかった指標にかかる効果発現要因の整理

指標の種別		指標3			指標4			—			—		
指標名		本町・五稜郭地区への来街頻度			函館駅前・大門地区への来街頻度								
種別	事業名・箇所名	目標未達成への影響度	総合所見	要因の分類	目標未達成への影響度	総合所見	要因の分類	目標未達成への影響度	総合所見	要因の分類	目標未達成への影響度	総合所見	要因の分類
基幹事業	道路(市道ときわ通改築事業)	△	市民アンケート調査では、高頻度(「ほぼ毎日」～「週1～4回」)で来街するまでにいたらなかったが、函館本町地区優良建築物等整備事業により共同住宅、商業施設および公共施設が整備され、居住人口や施設利用者が増加し、市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)には、オープンから6か月間で約18万人の来館があり、一定の効果をあげたと認められる。	III	—	市民アンケート調査では、高頻度(「毎日」～「週1回程度」)で来街するまでにいたらなかったが、函館駅前若松地区第一種市街地再開発事業により共同住宅、商業施設および公共施設が整備され、居住人口や施設利用者が増加し、子育て世代活動支援プラザ(はこだてキッズプラザ)、はこだておもしろ館(はこだてみらい館)には、オープンから1年間で約17万人の来館があり、一定の効果をあげたと認められる。	III						
	地域生活基盤施設(歩行者案内サイン整備事業)	△			△								
	高質空間形成施設(市道ときわ通歩道整備事業)	△			—								
	高次都市施設(子育て世代活動支援プラザ整備事業)	—			△								
	高次都市施設(はこだておもしろ館整備事業)	—			△								
	高次都市施設(市民交流プラザ整備事業)	△			—								
提案事業	地域創造支援事業(アーケード撤去事業)	—			△								
	地域創造支援事業(観光等案内情報端末整備事業)	△			△								
	地域創造支援事業(電車停留所整備事業)	△			△								
	地域創造支援事業(中心市街地出店促進事業)	△			△								
	地域創造支援事業(はこだておもしろ館整備事業)	—			△								
	事業活用調査(事業効果分析調査)	—			—								
関連事業	事業活用調査(都市構造に関する基礎調査)	—			—								
	函館駅前若松地区第一種市街地再開発事業	—			△								
	函館本町地区優良建築物等整備事業	△			—								
	函館市元気いっぱい商店街等支援交付金事業	△			△								

※目標未達成への影響度

- ××: 事業が効果を発揮せず、指標の目標未達成の直接的な原因となった。
- ×: 事業が効果を発揮せず、指標の目標未達成の間接的な原因となった。
- △: 数値目標が達成できなかった中でも、ある程度の効果をあげたと思われる。
- : 事業と指標の間には、もともと関係がないことが明確なので、評価できない。

※要因の分類

- 分類Ⅰ: 内的な要因で、予見が可能な要因。
- 分類Ⅱ: 外的な要因で、予見が可能な要因。
- 分類Ⅲ: 外的な要因で、予見が不可能な要因。
- 分類Ⅳ: 内的な要因で、予見が不可能な要因。

改善の方針 (記入は必須)	指標3	指標4
	<p>・人口減少と少子高齢化が進んだなかでも、まちの活力の維持を可能とするため、立地適正化計画に基づく都市機能の集約化や居住誘導により、一定の人口密度を維持する必要がある。</p> <p>・市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)においては、さらなる利用者増を図るとともに、来館者アンケート調査の結果、その施設利用のみを目的とした来街者の割合が約24%と高いことから、商店街や各店舗の魅力向上に向けた取り組みを支援していく必要がある。</p>	<p>・人口減少と少子高齢化が進んだなかでも、まちの活力の維持を可能とするため、立地適正化計画に基づく都市機能の集約化や居住誘導により、一定の人口密度を維持する必要がある。</p> <p>・子育て世代活動支援プラザ(はこだてキッズプラザ)、はこだておもしろ館(はこだてみらい館)、ふらっとDaimonの3つの施設においては、さらなる利用者増を図るとともに、来館者アンケート調査の結果、その施設利用のみを目的とした来街者の割合が約30%と高いことから、商店街および各店舗の魅力向上に向けた取り組みを支援していく必要がある。</p>

(4) 今後のまちづくり方策の作成

添付様式5-① 今後のまちづくり方策にかかる検討体制

名称等	検討メンバー	実施時期	担当部署
都市再生整備計画事業に係る庁内会議	関係各課(企画部計画推進室計画調整課, 公共交通担当, 経済部商業振興課, 中心市街地担当, 土木部道路建設課, 都市建設部都市計画課, 建築行政課, 企業局交通部施設課)	第1回 平成29年12月15日	経済部中心市街地担当

添付様式5-② まちの課題の変化

事業前の課題 都市再生整備計画に記載 したまちの課題	達成されたこと(課題の改善状況)	残された未解決の課題	事業によって発生した 新たな課題
中心市街地内の大型商業施設の閉店や、空き店舗の増加、魅力ある店舗の不足等により、市民の来街機会が減少している。	<ul style="list-style-type: none"> ・関連事業により再開発ビルが完成し、商業施設や公共施設の利用が増加した。 ・中心市街地出店促進事業により主要な道路沿道の空き店舗等に出店を促進させ、沿道の空き店舗の解消が図られた。 	<ul style="list-style-type: none"> ・整備した公共施設の集客をさらに促すとともに、さらなる来街を促すために商店街との連携を強化した取り組みを進め、回遊性の向上を図る必要がある。 ・既存店舗の魅力向上や商店街としての魅力ある事業を進めるとともに、情報発信やPRに努め、市民の来街機会の増加を図る必要がある。 ・主要な道路の後背地などの空き店舗解消や魅力的な店舗の出店などが必要である。 	<ul style="list-style-type: none"> ・市街地再開発事業や優良建築物等整備事業によって新たな商業施設や公共施設が完成し、自動車での来訪が増加したことにより、駐車場案内などへの対応が必要となった。
小売業年間販売額が減少にある中で、既存の施設だけでは集客に限界があり、中心市街地の活性化は難しいため、新たな集客力のある施設整備が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> ・市街地再開発事業および優良建築物等整備事業の確実な進展により、新たな商業施設が完成した。 ・子育て世代活動支援プラザ(はこだてキッズプラザ)、はこだておもしろ館(はこだてみらい館)には、親子での利用はもちろん、孫と祖父母といった方々が訪れており、また、市民交流プラザ(函館コミュニティプラザ)では、若者からお年寄りまで多世代による利用が図られ、中心市街地への来街者の増加がみられた。 	—	
中心市街地には、子どもやお年寄りが利用できる公共施設が不足しており、街なか居住の推進や来街者増加を図るためには、子どもからお年寄りまでが楽しめる施設整備が必要である。	<ul style="list-style-type: none"> ・市道ときわ通の整備やアーケード撤去事業により、安全な歩行空間の整備、電車停留所、歩行者案内サインおよび観光案内情報端末の整備による回遊しやすい環境が確保された。 	<ul style="list-style-type: none"> ・国が実施する函館駅前通の整備に合わせて、アーケード撤去事業を実施したが、安全・安心に歩行できる環境とするためには、駅前通整備事業の完了が急がれる。 	
中心市街地を訪れる人が、安全・安心に歩行できる環境づくりとともに、回遊しやすい環境づくりが必要である。	<ul style="list-style-type: none"> ・関連事業による再開発ビルや新たな商業施設、公共施設などの整備により、観光客が訪れやすい環境が整い、歩行者通行量や中心市街地の観光入込客数が増加した。 	<ul style="list-style-type: none"> ・整備した公共施設を利用する観光客の割合をさらに高めるよう、施設のPRなどに取り組む必要がある。 	
北海道新幹線新函館北斗駅から訪れる観光客を中心市街地へ呼び込み、街なかの賑わいを高める必要がある。			

これを受けて、成果の持続にかかる今後のまちづくり方策を添付様式5-③A欄に記入します。

これを受けて、改善策にかかる今後のまちづくり方策を添付様式5-③B欄に記入します。

添付様式5-③ 今後のまちづくり方策

	効果の持続を図る事項	効果を持続させるための基本的な考え方	想定される事業
A欄 効果を持続させるため に行う方策	新たな賑わいの創出	・基盤整備は、ほぼ達成されたので、今後は、ソフト事業の展開による新たな魅力の創出を図って行く。 ・賑わいを拡大させていくためには、商店街、まちづくり会社等が主体となって実施するよう必要な支援を行う。	・商店街やまちづくり会社等による効果的な事業・イベントの開催や公共施設と連携した事業の展開
	商業機能の強化と周知	・消費者が必要としている商業機能とするため、商店街やまちづくり会社、整備した公共施設などと情報を共有し、各個店が行う様々な取り組みに対し必要な支援を行う。	・商店街や各個店による店舗や地域の魅力向上の取り組みの推進

	改善する事項	改善策の基本的な考え方	想定される事業
B欄 改善策 ・未達成の目標を達成するための改善策 ・未解決の課題を解消するための改善策 ・新たに発生した課題に対する改善策	魅力ある商店街の形成	・魅力ある商店街の形成のため、消費者ニーズに応えるとともに、各個店それぞれが魅力を高める必要がある。	・中心市街地出店促進事業 ・商店街や各個店による店舗や地域の魅力向上の取り組みの推進
	様々な都市機能が集約され、人々が訪れたい中心市街地	・人口減少、高齢化社会に向け立地適正化計画に基づく都市機能の集約化と居住誘導による中心市街地の形成が必要である。 ・安全・安心な歩行空間の確保のため、国が実施する函館駅前通整備の早期完了を要望する。 ・整備した公共施設や商店街などの情報発信に取り組む。	・街なか居住促進事業 ・公共施設の利用促進に向けたPR活動 ・商店街や各個店による情報発信
	駐車場や店舗の位置情報	・自動車利用者向けの駐車場情報の提供。 ・民間駐車場や商店街等との提携駐車場のサービス拡大。 ・店舗情報などを記載した商店街マップの提供。	・駐車場位置情報周知事業 ・商店街マップ作成事業

フォローアップ又は次期計画等
において実施する改善策
を記入します。

なるべく具体的に記入して下さい。

■様式5-③の記入にあたっては、下記の事項を再確認して、これらの検討結果を踏まえて記載して下さい。(チェック欄)

●	交付金を活用するきっかけとなったまちづくりの課題(都市再生整備計画)を再確認した。
●	事業の実施過程の評価(添付様式3)を再確認した。
●	数値目標を達成した指標にかかる効果の持続・活用(添付様式4-②)を再確認した。
●	数値目標を達成できなかった指標にかかる改善の方針(添付様式4-③)を再確認した。
●	残された課題や新たな課題(添付様式5-②)を再確認した。

添付様式5-参考記述 今後のまちづくり方策に関するその他の意見

なし

添付様式5-④ 目標を定量化する指標にかかるフォローアップ計画

・フォローアップの要否に関わらず、添付様式2-①、2-②に記載した全ての指標について記入して下さい。
 ・従前値、目標値、評価値、達成度、1年以内の達成見込みは添付様式2-①、2-②から転記して下さい。

・評価値が「見込み」の全ての指標、目標達成度が△又は×の指標、1年以内の達成見込み「あり」の指標について、確定値を求めるためのフォローアップ計画を記入して下さい。

指標		単位	従前値		目標値		評価値		目標達成度	1年以内の達成見込みの有無	フォローアップ計画		
			年度	年度	年度	年度	確定	見込み			予定時期	計測方法	その他特記事項
指標1	歩行者通行量	人	40,416	H24	41,000	H29	確定 ●	45,551	○	あり			
							見込み			なし			
指標2	イベント開催数	回	45	H23	51	H29	確定 ●	57	○	あり	平成30年4月	平成29年4月から30年3月までのイベント開催状況を把握し、確定値とする。	
							見込み			なし			
指標3	本町・五稜郭地区への来街頻度	%	21	H21	26	H29	確定 ●	19.8	△	あり			
							見込み			なし ●			
指標4	函館駅前・大門地区への来街頻度	%	10.8	H20	20	H29	確定 ●	12.4	△	あり			
							見込み			なし ●			
指標5				H		H	確定			あり			
							見込み			なし			
その他の数値指標1	路面電車の乗降人員数	人	9,929	H23			確定 ●	10,903					
							見込み						
その他の数値指標2				H			確定						
							見込み						
その他の数値指標3				H			確定						
							見込み						

添付様式6 当該地区のまちづくり経験の次期計画や他地区への活かし方

・下表の点について、特筆すべき事項を記入します。

項目		要因分析	次期計画や他地区への活かし方
数値目標 ・成果の達成	うまくいった点	歩行者通行量については、これまでの傾向を踏まえた目標を設定し、再開発事業や公共施設の整備などによる来街者の増加により、目標値を上回ることができた。	目標指標の設定は、定期的を実施している調査結果などを参考にその傾向を的確に捉えることが必要である。
	うまくいかなかった点	来街頻度については、過去のデータ蓄積がなく、これまでの傾向(上昇傾向か、下降傾向か)を捉えることができない中で、上昇する目標値を設定しており、達成が困難な目標値となっていた。	
数値目標と 目標・事業との 整合性等	うまくいった点	—	目標指標の設定にあつては、十分に事業効果を検討し、適正に確認できる指標とする必要がある。
	うまくいかなかった点	指標3および4の市民アンケート調査は、集客施設の完成から間もない中で実施しており、その波及効果が反映される結果とならなかった。こうした調査の実施にあつては、集客施設等の完成から数値指標の計測まで一定程度の期間が必要であると考えます。	
住民参加 ・情報公開	うまくいった点	—	
	うまくいかなかった点	—	
PDCAによる事業 ・評価の進め方	うまくいった点	—	
	うまくいかなかった点	—	
その他	うまくいった点	—	
	うまくいかなかった点	—	

添付様式6－参考記述 今後、まちづくり交付金の活用予定、又は事後評価を予定している地区の名称(当該地区の次期計画も含む)

なし
